


Časový plán

Identifik	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	september 2025	október 2025							
					1.9	8.9	15.9	22.9	29.9	6.10	13.10	20.10	27.10
1	Rekonštrukcia cesty II/507 Mostová intravilán kkm 32,270 - 33,070	52 dni	Po 8.9.25	Št 30.10.25									
2	prevzatie staveniska, odsúhlasené DDZ	4 dni	Po 8.9.25	Pi 12.9.25									
3	ľavá polovica kkm 32,270 - 32,670 (400 m)	13 dni	Pi 12.9.25	Št 25.9.25									
4	rozmiestnenie DDZ	1 deň	Pi 12.9.25	So 13.9.25									
5	frézovanie hr. 120 mm	2 dni	Pi 12.9.25	Ne 14.9.25									
6	zrezanie krajníc, čistenie priekop	2 dni	Ne 14.9.25	Ut 16.9.25									
7	ŠD, CBGM	8 dni	Ne 14.9.25	Po 22.9.25									
8	ložná vrstva	1 deň	Po 22.9.25	Ut 23.9.25									
9	dosypanie krajníc	2 dni	Ut 23.9.25	Št 25.9.25									
10	pravá polovica kkm 32,270 - 32,670 (400 m)	11 dni	Št 25.9.25	Po 6.10.25									
11	preloženie DDZ	1 deň	Št 25.9.25	Pi 26.9.25									
12	frézovanie hr. 120 mm	2 dni	Št 25.9.25	So 27.9.25									
13	zrezanie krajníc, čistenie priekop	2 dni	So 27.9.25	Po 29.9.25									
14	výmena poklopov za samonivelizačné	2 dni	So 27.9.25	Po 29.9.25									
15	ložná vrstva	1 deň	Po 29.9.25	Ut 30.9.25									
16	dosypanie krajníc	2 dni	Ut 30.9.25	Št 2.10.25									
17	obrus	2 dni	Št 2.10.25	So 4.10.25									
18	smerové stĺpiky, plašič zveri	2 dni	So 4.10.25	Po 6.10.25									
19	ľavá polovica kkm 32,670 - 33,070 (410 m)	13 dni	Po 6.10.25	Ne 19.10.25									
20	rozmiestnenie DDZ	1 deň	Po 6.10.25	Ut 7.10.25									
21	frézovanie hr. 120 mm	2 dni	Po 6.10.25	Str 8.10.25									
22	zrezanie krajníc, čistenie priekop	2 dni	Str 8.10.25	Pi 10.10.25									
23	ŠD, CBGM	8 dni	Str 8.10.25	Št 16.10.25									
24	ložná vrstva	1 deň	Št 16.10.25	Pi 17.10.25									
25	dosypanie krajníc	2 dni	Pi 17.10.25	Ne 19.10.25									
26	pravá polovica kkm 32,670 - 33,070 (410 m)	11 dni	Ne 19.10.25	Št 30.10.25									
27	preloženie DDZ	1 deň	Ne 19.10.25	Po 20.10.25									
28	frézovanie hr. 120 mm	2 dni	Ne 19.10.25	Ut 21.10.25									
29	zrezanie krajníc, čistenie priekop	2 dni	Ut 21.10.25	Št 23.10.25									
30	výmena poklopov za samonivelizačné	2 dni	Ut 21.10.25	Št 23.10.25									
31	ložná vrstva	1 deň	Št 23.10.25	Pi 24.10.25									
32	dosypanie krajníc	2 dni	Pi 24.10.25	Ne 26.10.25									
33	obrus	2 dni	Ne 26.10.25	Ut 28.10.25									
34	smerové stĺpiky, plašič zveri	2 dni	Ut 28.10.25	Št 30.10.25									

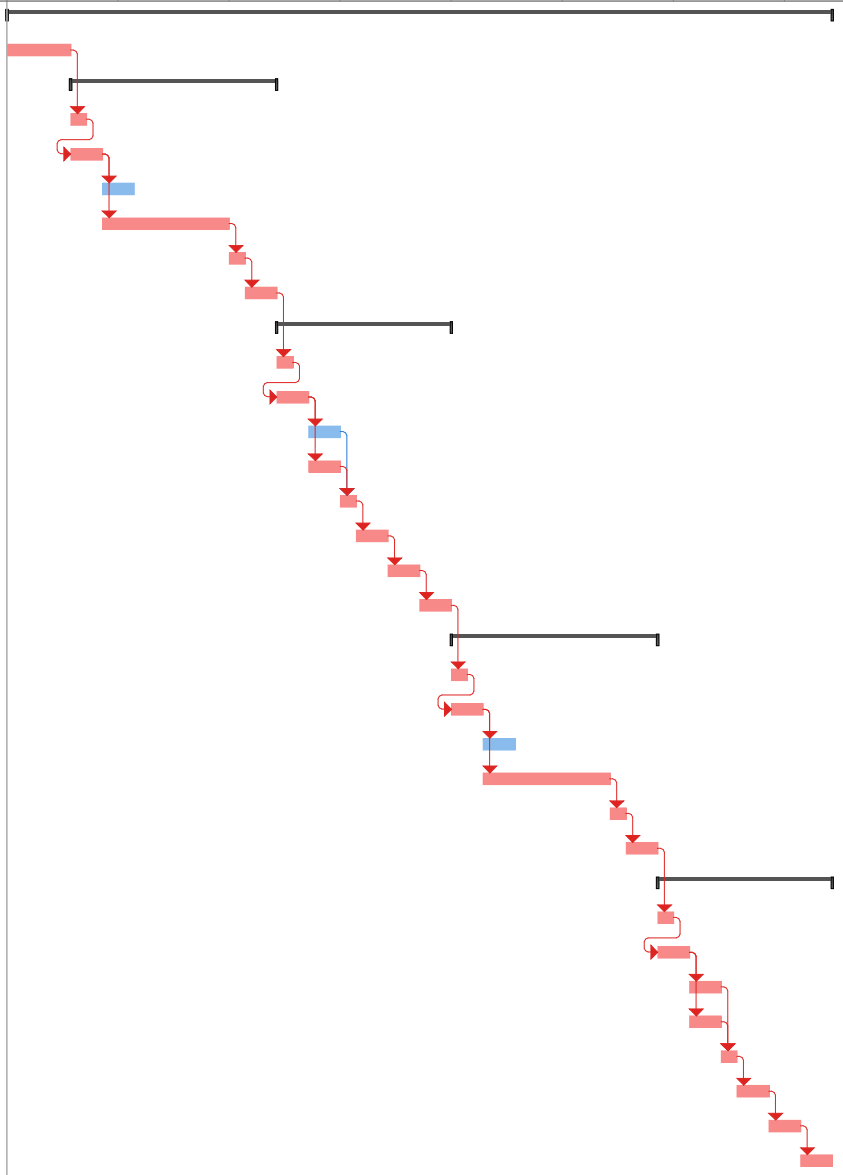

Dátum: Str 13.8.25

Úloha		Súhrn projektu		Manuálna úloha		Iba začiatok		Termín		Manuálny priebeh	
Rozdeliť		Neaktívna úloha		Iba trvanie		Iba dokončiť		Kritické			
Medzník		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Externé úlohy		Kritické rozdelenie			
Súhrn		Neaktívny súhrn		Manuálny súhrn		Externý medzník		Priebeh			
